



RENOVATIE

KADE HET NIEUWE WERK

PROJECT UPDATE Nr. 8, april 2024


TERUGBLIK WEKEN 14 T/M 18

In april zijn door firma K_Dekker diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om te kunnen starten met het betonwerk. Zo is aan de water- en landzijde een werkvloer (tijdelijke betonvloer) gestort. Op de kadeconstructie zijn bevestigingspunten aangebracht om de bekisting aan vast te maken. Aansluitend is gestart met het produceren van de wapening voor de betonconstructie.

Met het wapenen van de betonconstructie wordt rekening gehouden met de afmeervoorzieningen. Zo worden er ankers geplaatst voor de bolders en voor het aanbrengen van de drenkelingladders. Ook zijn er putten en mantelbuizen voorzien, hierdoor kunnen later gemakkelijk de kabels en leidingen worden aangebracht.

Vanaf week 16 is gestart met het vlechten van de wapening voor de betonconstructie. Van de gehele kade is nu ca. 50 van de 280 meter voorzien van wapening.

Door De Klerk Staalconstructie zijn diverse staalprofielen geproduceerd en geleverd. Deze profielen zullen toegepast gaan worden ter hoogte van drenkelingladders en aan de voor- en achterzijde van de betonconstructie ter bescherming van het beton en de afmeertrossen van de schepen.

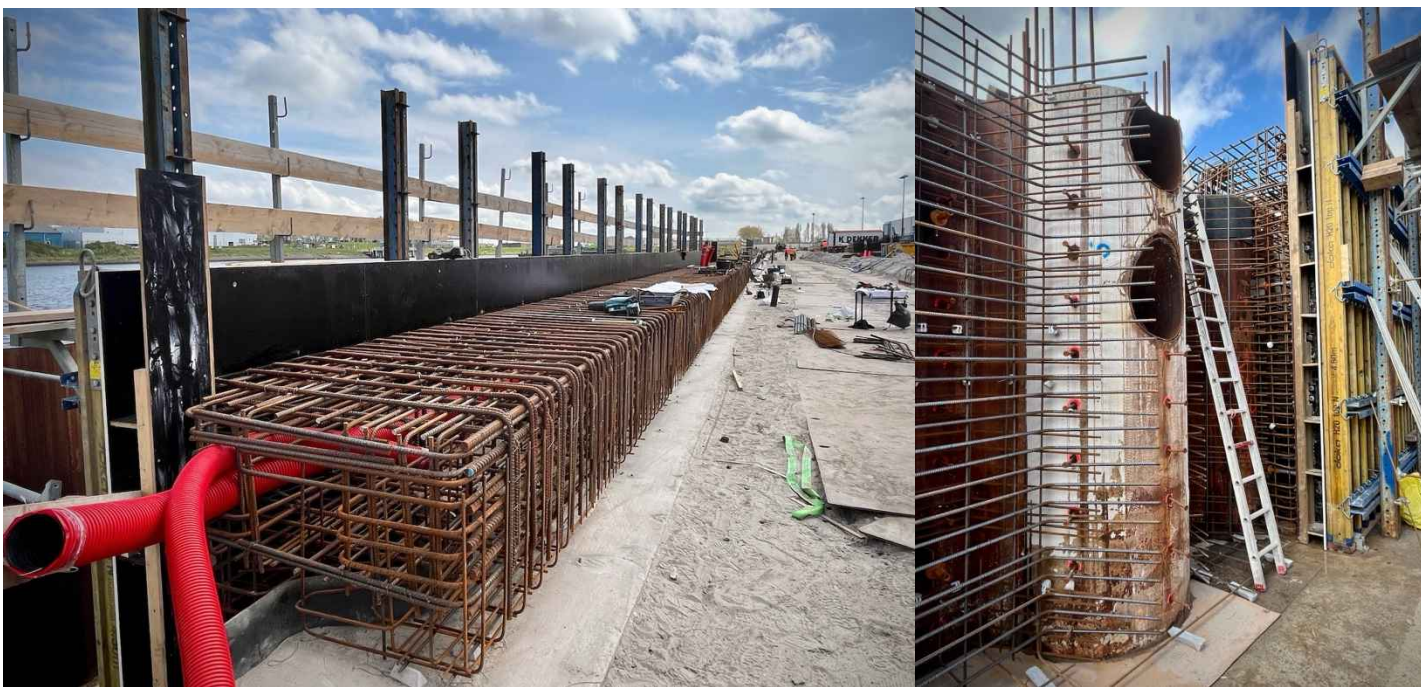

VOORUITBLIK MEI

Vanaf mei zal aanvang worden gemaakt met het storten van het beton. De gehele kade is verdeeld in 11 delen (betonmooten) van 28 meter lengte. Nadat de eerste moot is gestort, zal ca. iedere week een volgende moot worden gestort.

